









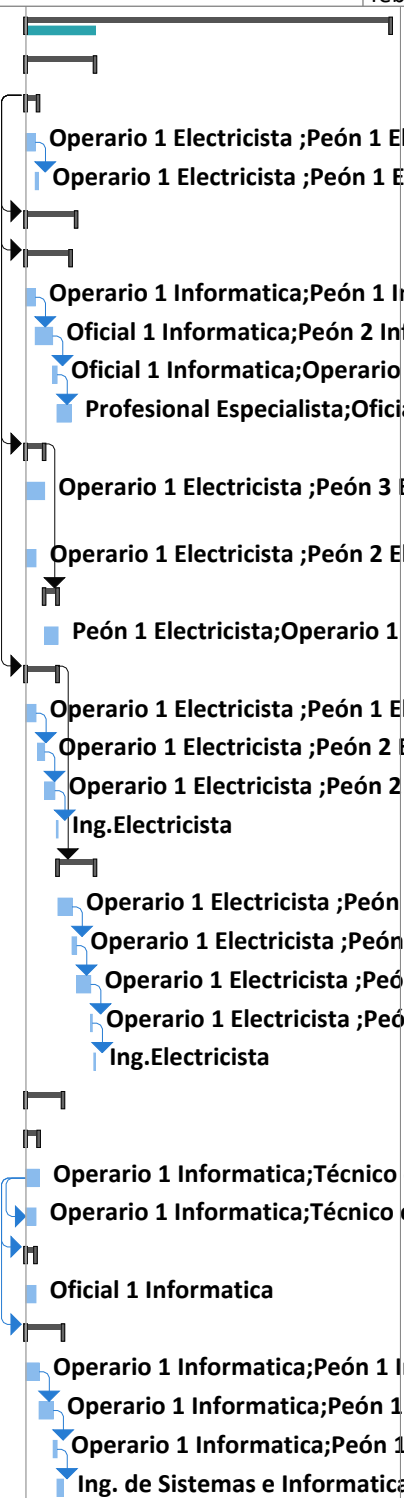











Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	diciembre		enero		febrero							
1	II.EE. CARLOS NORIEGA JIMENEZ	17 días	lun 14/01/19												
2	INSTALACION ELECTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN	3.75 días	lun 14/01/19												
3	1.12.2 Montaje de trabajos preliminares	0.63 días	lun 14/01/19												
4	1.12.2.1 Instalación de cartel de obra	3 horas	lun 14/01/19												
5	1.12.2.2 Instalación de placa recordatoria	2 horas	lun 14/01/19												
6	1.10.2 Montaje de torre de elevación	2.75 días	lun 14/01/19												
11	1.4.2. Instalación de la red de comunicaciones	2.13 días	lun 14/01/19												
12	1.4.2.1 Instalacion de gabinete de comunicación	3 horas	lun 14/01/19												
13	1.4.2.2 Colocacion de tubos canaletas y cajas de paso	6 horas	lun 14/01/19												
14	1.4.2.3 Instalación y conectorizacion de cable F/UTP	4 horas	mar 15/01/19												
15	1.4.2.4 Montaje y configuracion de switch y Access Point	4 horas	mar 15/01/19												
16	1.8.2 Montaje de circuito y tablero electrico	1 día	lun 14/01/19												
17	1.8.2.1 Instalación del circuito electrico para el servidor - estacion de carga de laptop	1 día	lun 14/01/19												
18	1.8.2.2 Instalacion de tablero metálico	4 horas	lun 14/01/19												
19	1.9.2 Montaje de circuito electrico para proyectores	0.75 días	mar 15/01/19												
20	1.9.2.1 Montaje de circuito eléctrico para proyectores	6 horas	mar 15/01/19												
21	1.6.2 Montaje de puesta a tierra para pararrayos	1.75 días	lun 14/01/19												
22	1.6.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	lun 14/01/19												
23	1.6.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	lun 14/01/19												
24	1.6.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mar 15/01/19												
25	1.6.2.4 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	mar 15/01/19												
26	1.7.2. Montaje de puesta a tierra para el Servidor	2 días	mar 15/01/19												
27	1.7.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	mar 15/01/19												
28	1.7.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	mié 16/01/19												
29	1.7.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mié 16/01/19												
30	1.7.2.4 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero principal	2 horas	jue 17/01/19												
31	1.7.2.5 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	jue 17/01/19												
32	MONTAJE Y CONFIGURACION	2 días	lun 14/01/19												
33	1.1.2 MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.75 días	lun 14/01/19												
34	1.1.2.1 Configuración de computadoras portatiles	6 horas	lun 14/01/19												
35	1.1.2.2 Acondicionamiento y montaje de servidor	4 horas	lun 14/01/19												
36	1.2.2. Montaje de Sistema de Alarma	0.5 días	lun 14/01/19												
37	1.2.2.1 Instalación del sistema de alarma	4 horas	lun 14/01/19												
38	1.3.2. Montaje de sistema multimedia	2 días	lun 14/01/19												
39	1.3.2.1 Instalacion de rack y pizarra acrilica para proyector multimedia	6 horas	lun 14/01/19												
40	1.3.2.2 Instalacion de canaletas, caja cuadrada y cable HDMI	4 horas	lun 14/01/19												
41	1.3.2.3 Montaje de proyector multimedia	3 horas	mar 15/01/19												
42	1.3.2.4 Revision y pruebas de multimedia	3 horas	mar 15/01/19												
Proyecto: CRONOGRAMA Fecha: jue 20/12/18		Tarea								Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
		División								Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
		Hito								Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
		Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso manual							
		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo									
Página 1															
