


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Nombres de los recursos					
							abril	mayo	junio	julio	agosto
1	II.EE. TUPAC AMARU	34.5 días	lun 12/05/14	sáb 21/06/14							
2	INSTALACION ELECTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN	4.63 días	lun 12/05/14	vie 16/05/14							
3	1.12.2 Montaje de trabajos preliminares	0.63 días	lun 12/05/14	lun 12/05/14							
4	1.12.2.1 Instalación de cartel de obra	3 horas	lun 12/05/14	lun 12/05/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
5	1.12.2.2 Instalación de placa recordatoria	2 horas	lun 12/05/14	lun 12/05/14	4	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
6	1.10.2 Montaje de torre de elevación	2.75 días	lun 12/05/14	mié 14/05/14	3CC						
7	1.10.2.1 Excavación de Hoyo para la base de torre	6 horas	lun 12/05/14	lun 12/05/14		Peón 2 Electricista					
8	1.10.2.2 Excavación de Hoyo para los anclajes de la torre	4 horas	lun 12/05/14	mar 13/05/14	7	Peón 3 Electricista					
9	1.10.2.3 Encofrado de base ,anclaje y armado de estructura de fierro en forma de canastilla y vaciado	4 horas	mar 13/05/14	mar 13/05/14	8	Oficial 1 Electricista,Peón 1 Electricista					
10	1.10.2.4 Ensamblaje de torre y accesorios	1 día	mar 13/05/14	mié 14/05/14	9	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
11	1.4.2. Instalación de la red de comunicaciones	4.63 días	lun 12/05/14	vie 16/05/14	3CC						
12	1.4.2.1 Instalacion de gabinete de comunicación	3 horas	lun 12/05/14	lun 12/05/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
13	1.4.2.2 Colocacion de tubos canaletas y cajas de paso	16 horas	lun 12/05/14	mié 14/05/14	12	Oficial 1 Informatica,Peón 2 Informatica					
14	1.4.2.3 Instalación y conectorizacion de cable F/UTP	10 horas	mié 14/05/14	jue 15/05/14	13	Oficial 1 Informatica,Operario 1 Informatica					
15	1.4.2.4 Montaje y configuracion de switch y Access Point	8 horas	jue 15/05/14	vie 16/05/14	14	Profesional Especialista,Oficial 1 Informatica					
16	1.8.2 Montaje de circuito y tablero electrico	1 día	lun 12/05/14	lun 12/05/14	3CC						
17	1.8.2.1 Instalación del circuito electrico para el servidor - estacion de carga de laptop	1 día	lun 12/05/14	lun 12/05/14		Operario 1 Electricista ,Peón 3 Electricista					
18	1.8.2.2 Instalacion de tablero metálico	4 horas	lun 12/05/14	lun 12/05/14		Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
19	1.9.2 Montaje de circuito electrico para proyectores	2 días	mar 13/05/14	mié 14/05/14	16						
20	1.9.2.1 Montaje de circuito eléctrico para proyectores	16 horas	mar 13/05/14	mié 14/05/14		Peón 1 Electricista,Operario 1 Electricista					
21	1.6.2 Montaje de puesta a tierra para pararrayos	1.75 días	lun 12/05/14	mar 13/05/14	3CC						
22	1.6.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	lun 12/05/14	lun 12/05/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
23	1.6.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	lun 12/05/14	lun 12/05/14	22	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
24	1.6.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mar 13/05/14	mar 13/05/14	23	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
25	1.6.2.4 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	mar 13/05/14	mar 13/05/14	24	Ing.Electricista					
26	1.7.2. Montaje de puesta a tierra para el Servidor	2 días	mar 13/05/14	jue 15/05/14	21						
27	1.7.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	mar 13/05/14	mié 14/05/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
28	1.7.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	mié 14/05/14	mié 14/05/14	27	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
29	1.7.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mié 14/05/14	jue 15/05/14	28	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
30	1.7.2.4 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero principal	2 horas	jue 15/05/14	jue 15/05/14	29	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
31	1.7.2.5 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	jue 15/05/14	jue 15/05/14	30	Ing.Electricista					
32	MONTAJE Y CONFIGURACION	5.75 días	lun 16/06/14	sáb 21/06/14							
33	1.1.2 MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	2 días	lun 16/06/14	mar 17/06/14							
34	1.1.2.1 Configuración de computadoras portatiles	16 horas	lun 16/06/14	mar 17/06/14		Operario 1 Informatica,Técnico en Informát					
35	1.1.2.2 Acondicionamiento y montaje de servidor	4 horas	mar 17/06/14	mar 17/06/14	34CC	Operario 1 Informatica,Técnico en Informát					
36	1.2.2. Montaje de Sistema de Alarma	0.5 días	lun 16/06/14	lun 16/06/14	34CC						
37	1.2.2.1 Instalación del sistema de alarma	4 horas	lun 16/06/14	lun 16/06/14		Oficial 1 Informatica					
38	1.3.2. Montaje de sistema multimedia	4.75 días	mar 17/06/14	sáb 21/06/14	34CC						
39	1.3.2.1 Instalacion de rack y pizarra acrilica para proyector multimedia	12 horas	mar 17/06/14	mié 18/06/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
40	1.3.2.2 Instalacion de canaletas, caja cuadrada y cable HDMI	12 horas	mié 18/06/14	jue 19/06/14	39	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
41	1.3.2.3 Montaje de proyector multimedia	8 horas	vie 20/06/14	vie 20/06/14	40	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
42	1.3.2.4 Revision y pruebas de multimedia	6 horas	sáb 21/06/14	sáb 21/06/14	41	Ing. de Sistemas e Informatica					

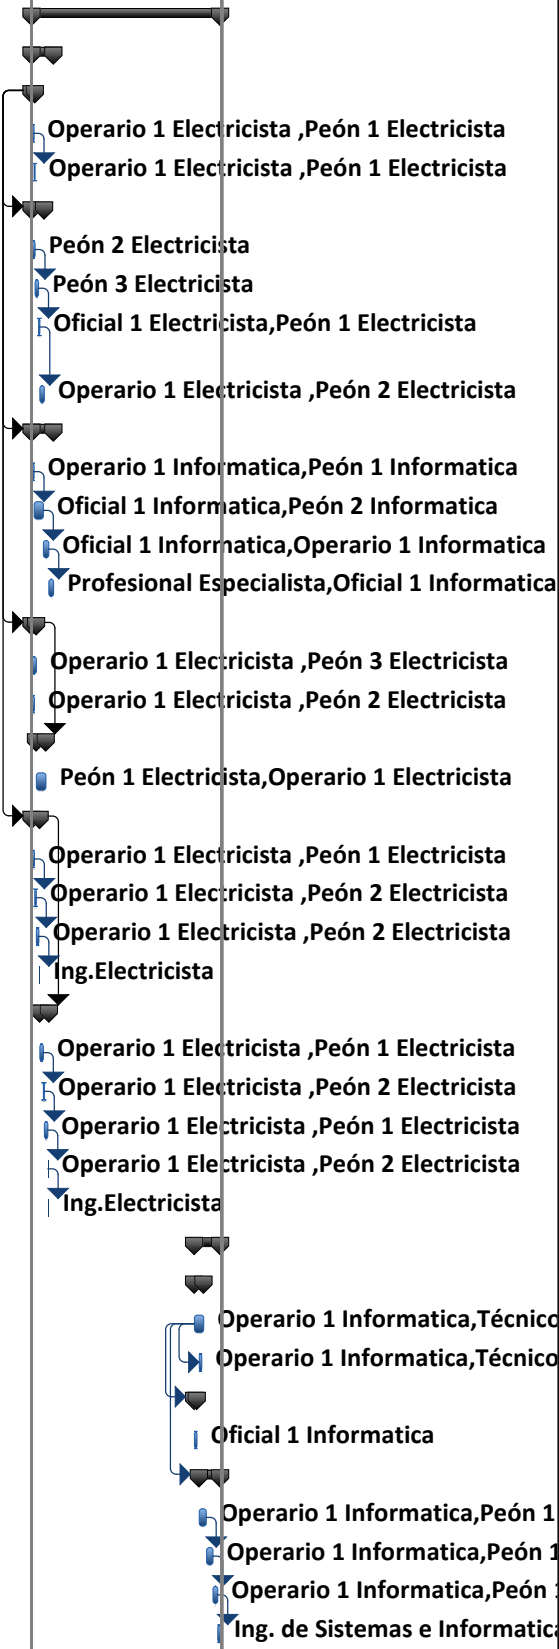

Proyecto: II.EE. TUPAC AMARU.m
Fecha: lun 27/01/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 1
