


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Nombres de los recursos					
							mayo	junio	julio	agosto	septiembre
1	II.EE. FERNANDO BELAUNDE TERRY	19 días	vie 13/06/14	sáb 05/07/14							
2	INSTALACION ELECTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN	4.63 días	vie 13/06/14	mié 18/06/14							
3	1.12.2 Montaje de trabajos preliminares	0.63 días	vie 13/06/14	vie 13/06/14							
4	1.12.2.1 Instalación de cartel de obra	3 horas	vie 13/06/14	vie 13/06/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
5	1.12.2.2 Instalación de placa recordatoria	2 horas	vie 13/06/14	vie 13/06/14	4	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
6	1.10.2 Montaje de torre de elevación	2.75 días	vie 13/06/14	lun 16/06/14	3CC						
7	1.10.2.1 Excavación de Hoyo para la base de torre	6 horas	vie 13/06/14	vie 13/06/14		Peón 2 Electricista					
8	1.10.2.2 Excavación de Hoyo para los anclajes de la torre	4 horas	vie 13/06/14	sáb 14/06/14	7	Peón 3 Electricista					
9	1.10.2.3 Encofrado de base ,anclaje y armado de estructura de fierro en forma de canastilla y vaciado	4 horas	sáb 14/06/14	sáb 14/06/14	8	Oficial 1 Electricista,Peón 1 Electricista					
10	1.10.2.4 Ensamblaje de torre y accesorios	1 día	lun 16/06/14	lun 16/06/14	9	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
11	1.4.2. Instalación de la red de comunicaciones	4.63 días	vie 13/06/14	mié 18/06/14	3CC						
12	1.4.2.1 Instalacion de gabinete de comunicación	3 horas	vie 13/06/14	vie 13/06/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
13	1.4.2.2 Colocacion de tubos canaletas y cajas de paso	16 horas	vie 13/06/14	lun 16/06/14	12	Oficial 1 Informatica,Peón 2 Informatica					
14	1.4.2.3 Instalación y conectorizacion de cable F/UTP	10 horas	lun 16/06/14	mar 17/06/14	13	Oficial 1 Informatica,Operario 1 Informatica					
15	1.4.2.4 Montaje y configuracion de switch y Access Point	8 horas	mar 17/06/14	mié 18/06/14	14	Profesional Especialista,Oficial 1 Informatica					
16	1.8.2 Montaje de circuito y tablero electrico	1 día	vie 13/06/14	vie 13/06/14	3CC						
17	1.8.2.1 Instalación del circuito electrico para el servidor - estacion de carga de laptop	1 día	vie 13/06/14	vie 13/06/14		Operario 1 Electricista ,Peón 3 Electricista					
18	1.8.2.2 Instalacion de tablero metálico	4 horas	vie 13/06/14	vie 13/06/14		Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
19	1.9.2 Montaje de circuito electrico para proyectores	2 días	sáb 14/06/14	mar 17/06/14	16						
20	1.9.2.1 Montaje de circuito eléctrico para proyectores	16 horas	sáb 14/06/14	mar 17/06/14		Peón 1 Electricista,Operario 1 Electricista					
21	1.6.2 Montaje de puesta a tierra para pararrayos	1.75 días	vie 13/06/14	sáb 14/06/14	3CC						
22	1.6.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	vie 13/06/14	vie 13/06/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
23	1.6.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	vie 13/06/14	vie 13/06/14	22	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
24	1.6.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	sáb 14/06/14	sáb 14/06/14	23	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
25	1.6.2.4 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	sáb 14/06/14	sáb 14/06/14	24	Ing.Electricista					
26	1.7.2. Montaje de puesta a tierra para el Servidor	2 días	lun 16/06/14	mar 17/06/14	21						
27	1.7.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	lun 16/06/14	lun 16/06/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
28	1.7.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	lun 16/06/14	lun 16/06/14	27	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
29	1.7.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mar 17/06/14	mar 17/06/14	28	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
30	1.7.2.4 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero principal	2 horas	mar 17/06/14	mar 17/06/14	29	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
31	1.7.2.5 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	mar 17/06/14	mar 17/06/14	30	Ing.Electricista					
32	MONTAJE Y CONFIGURACION	2.75 días	jue 03/07/14	sáb 05/07/14							
33	1.1.2 MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	1 día	jue 03/07/14	jue 03/07/14							
34	1.1.2.1 Configuración de computadoras portatiles	8 horas	jue 03/07/14	jue 03/07/14		Operario 1 Informatica,Técnico en Informát					
35	1.1.2.2 Acondicionamiento y montaje de servidor	4 horas	jue 03/07/14	jue 03/07/14	34CC	Operario 1 Informatica,Técnico en Informát					
36	1.2.2. Montaje de Sistema de Alarma	0.5 días	jue 03/07/14	jue 03/07/14	34CC						
37	1.2.2.1 Instalación del sistema de alarma	4 horas	jue 03/07/14	jue 03/07/14		Oficial 1 Informatica					
38	1.3.2. Montaje de sistema multimedia	2.75 días	jue 03/07/14	sáb 05/07/14	34CC						
39	1.3.2.1 Instalacion de rack y pizarra acrilica para proyector multimedia	6 horas	jue 03/07/14	jue 03/07/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
40	1.3.2.2 Instalacion de canaletas, caja cuadrada y cable HDMI	8 horas	jue 03/07/14	vie 04/07/14	39	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
41	1.3.2.3 Montaje de proyector multimedia	4 horas	vie 04/07/14	sáb 05/07/14	40	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
42	1.3.2.4 Revision y pruebas de multimedia	4 horas	sáb 05/07/14	sáb 05/07/14	41	Ing. de Sistemas e Informatica					

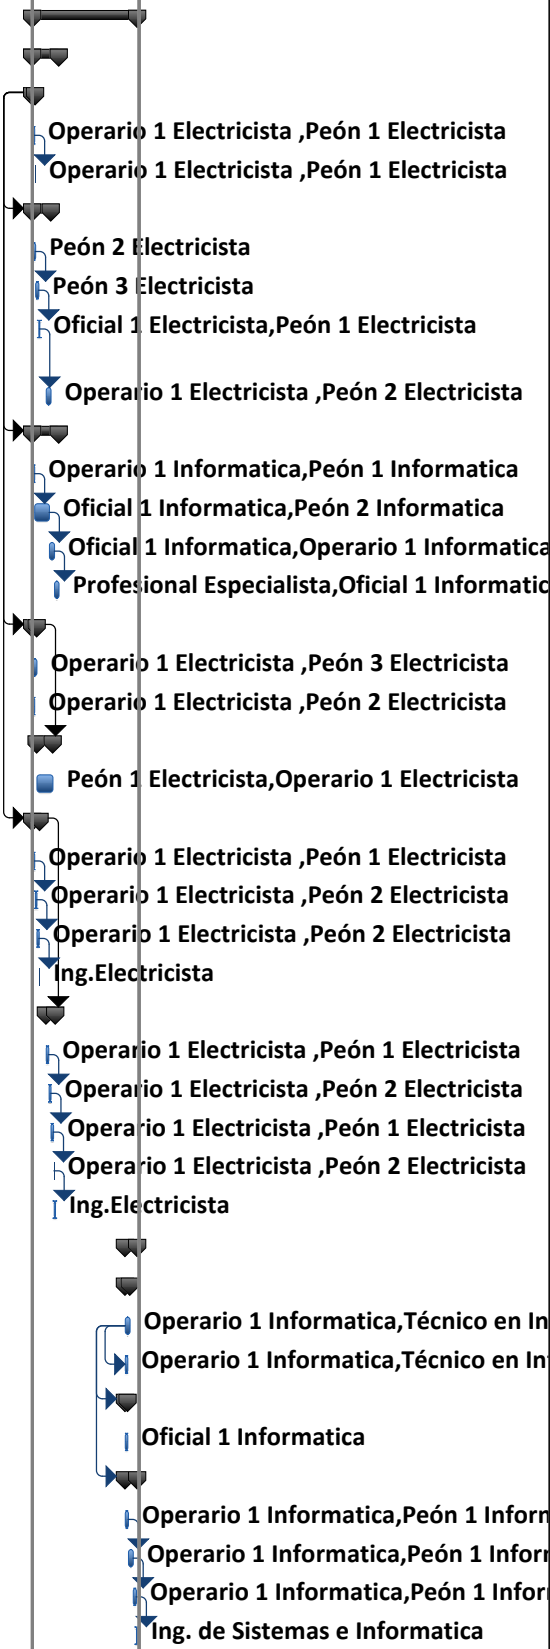

Proyecto: II.EE. FERNANDO BELAU
Fecha: lun 27/01/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso
